

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОТЧЕТ


Отличительной чертой инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2008 год является то, что результат года формируется из итогов работы ОАО «МРСК Юга» как управляющей компании в I квартале 2008 года и отчетных показателей единой операционной компании за II-IV квартал 2008 года, в соответствии с утвержденной 19 декабря 2008 года Советом директоров Общества инвестиционной программой ОАО «МРСК Юга» (Протокол № 21/2008 заседания Совета Директоров ОАО «МРСК Юга»).

В целом по ОАО «МРСК Юга» за 2008 год освоены капитальные вложения по инвестиционной программе в сумме 5 341,5 млн. рублей (без НДС).

3.1. ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование	2008 календарный						
	Освоение	Ввод ОФ	Финансирование	Ввод мощности		Прирост мощности	
	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	МВА	км.	МВА	км.
Астраханьэнерго	590,2	492,9	479,62	97,5	164,9	77,7	108,63
Волгоградэнерго	1078,6	1076,2	1 136,5	82,7	275,8	61,8	22,59
Калмэнерго	79,2	80,4	51,4	29,5	314,0	29,5	261,36
Ростовэнерго	3337,7	3104,6	2 515,28	323,5	577,6	289,4	184,06
Кубаньэнерго	4,27	4,27	0	0	0	0	0
Исполнительный аппарат	251,5	64,9	122,35	0	0	0	0
ОАО «МРСК Юга»	5 341,5	4 823,3	4 305,15	533,2	1 332,1	458,4	576,6

Наименование	2008 операционный						
	Освоение	Ввод ОФ	Финансирование	Ввод мощности		Прирост мощности	
	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	МВА	км.	МВА	км.
Астраханьэнерго	537,67	485,81	382,31	97,45	164,85	77,77	108,63
Волгоградэнерго	905,07	957,48	837,27	82,68	225,83	61,78	22,59
Калмэнерго	74,06	79,63	51,4	29,52	313,96	29,52	261,36
Ростовэнерго	2 879,25	2 997,85	1 759,07	310,16	515,32	276,72	184,06
Кубаньэнерго	4,27	4,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнительный аппарат	251,46	64,90	122,35	0,00	0,00	0,00	0,00
ОАО «МРСК Юга»	4 651,78	4 589,93	3 152,4	519,81	1 219,96	445,7	576,6

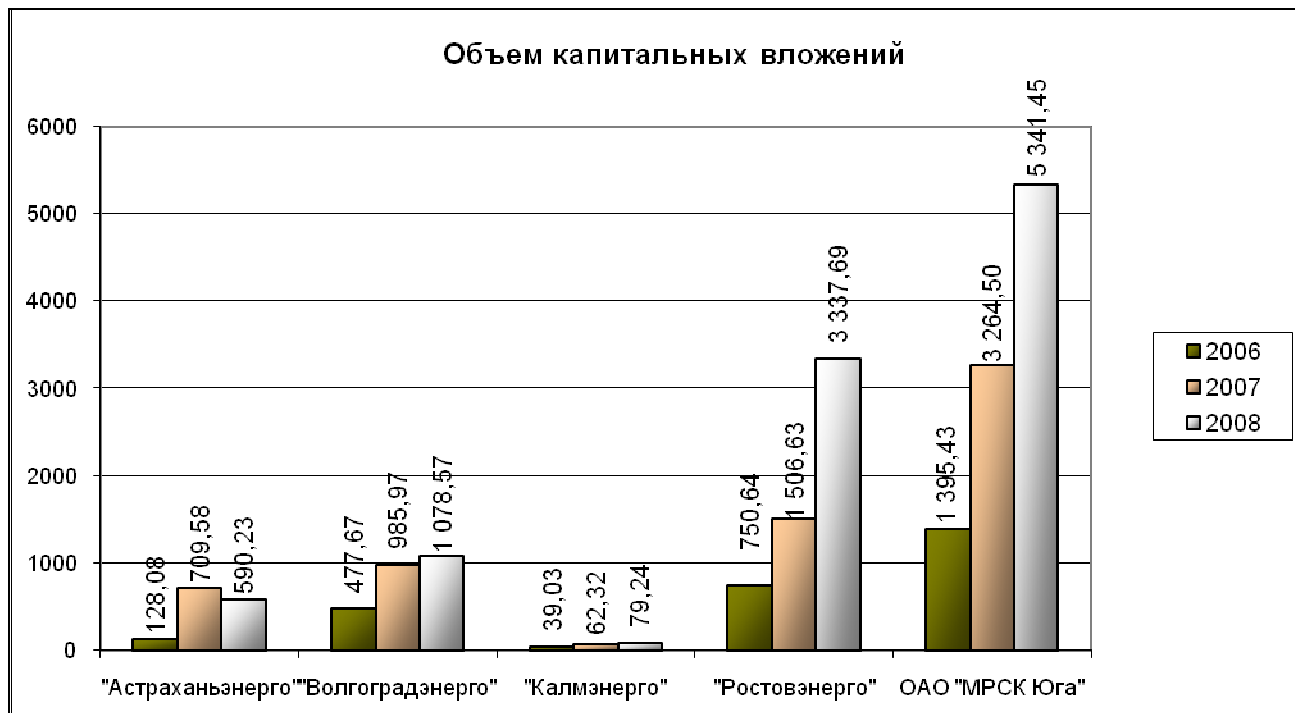

В отчетном календарном 2008 году капитальные вложения были направлены:

- на цели технического перевооружения и реконструкции использовано 2445,61 млн. рублей (без НДС), при плане 2070,37 млн. рублей (без НДС);
- на новое строительство 2829,07 млн. рублей (без НДС) при плане 2850,87 млн. рублей (без НДС);
- на приобретение профильного имущества 66,8 млн. рублей (без НДС), при плане 65,98 млн. рублей (без НДС).

По договорам лизинга в 2008 году платежи составили 139,24 млн. рублей (без НДС), освоение 89,62 млн. рублей (без НДС).

НАПРАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

В целях реализации инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» в отчетном 2008 году капитальные вложения направлялись на объекты технического перевооружения, реконструкции и нового строительства.

Критериями включения инвестиционных проектов в инвестиционную программу ОАО «МРСК Юга» является повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергией, необходимые для подготовки к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок, социальнозначимые объекты, для повышения надежности функционирования электросетевого оборудования ОАО «МРСК Юга».

В истекшем 2008 году Обществом реализовывались следующие наиболее значимые инвестиционные проекты:

- «Строительство ПС 110/10кВ «А-26» в Новоалександровской зоне г. Азова с трансформаторами 2x40 МВА (первый пусковой комплекс)» - строительство предусмотрено совместным соглашением между РАО «ЕЭС России» и Администрацией Ростовской области и предназначено для электроснабжения бурно развивающейся промышленной юго-восточной части г. Азова (Новоалександровская зона).

- «Строительство ПС 110/10/6кВ «Р-28» (ДОСААФ) с КЛ-110кВ «Р8-Р28». Реконструкция ПС 110/1035/6 кВ «Р-8» - строительство предусмотрено совместным соглашением между РАО «ЕЭС России» и Администрацией Ростовской области, предназначена для электроснабжения Советского района г. Ростова-на-Дону и особенно для выполнения правительственной программы «Жилье».
- «Строительство участка ЛЭП 110 кВ «А1-А30» с расширением ПС 110/35/6 кВ «А-1» (первый пусковой комплекс) – реконструируется ОРУ 110 кВ с заменой морально и физически изношенного трансформатора на новый 40 МВА, предназначено для повышения надежности и качества электроснабжения промышленных предприятий и бытовых потребителей г. Азова.
- «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Мартыновская» - реконструкция подстанции необходима для покрытия возросших нагрузок электроснабжения сельскохозяйственных производителей и бытовых потребителей, вызвана моральным и физическим износом оборудования (подстанция построена в шестидесятые годы прошлого столетия и полностью себя самортизировала).
- «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Сысоево-Чертково» с выносом участка ВЛ 110 кВ с территории Украины» - сооружается для выноса этой ВЛ с территории Украины. Это позволяет избежать значительных потерь, связанных с таможенными пошлинами.
- «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ «Б-3 – Б-12». Реконструкция ОРУ 110 кВ на ПС «Б-12» - предназначена для обеспечения надежного электроснабжения вновь построенной шахты «Быстрианская», являющейся потребителем 1 категории.
- «Реконструкция ПС 110 кВ «Ш-8», «Ш-44» и строительство двух ВЛ 110 кВ «Н8-НЗНП», «Ш44-НЗНП» - предназначена для электроснабжения сооружаемого нефтеперегонного завода в районе г. Красный Сулин.
- «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Тиховская» - вызвана необходимостью замены изношенного морально и физически оборудования, а также повышением надежности электроснабжения газо- и нефтеперекачивающих станций и трубопроводов к западной границе Российской Федерации.
- В 2008 году начата реализация инвестиционного проекта ВЛ 110 кВ Солодники – Старица (№ 721) общей протяженностью 57,1км, ввод которой запланирован на 2009 год.
- «Реконструкция подстанции 110 кВ «Олимпийская» с увеличением трансформаторной мощности с 2х 16 МВА на 2х40 МВА» позволила разгрузить существующие электрические сети 6 кВ Дзержинского района г. Волгограда, повысить надежность электроснабжения существующих жизненно-важных объектов и дала возможность подключения новых потребителей.
- Реконструкция ВЛ-110 кВ №270 «Степана Разина-Танина». Ввод в эксплуатацию обеспечил снижение числа аварийных отключений (сохранение объема отпускаемой энергии) и увеличение надежности в работе ВЛ для электроснабжения производственных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых потребителей Левобережных районов Волгоградской области.
- Реконструкция ВЛ-110кВ №410 «Коробки-Филино» значительно повысила надежность электроснабжения водозабора и водоочистных сооружений г. Котово Волгоградской области.
- Реконструкция ВЛ 35 кВ «КТЭЦ-К3» - реконструкция вызвана вынесением ВЛ с территории жилой застройки г. Каменск-Шахтинский и полным износом существующей ВЛ, а также необходимостью повышения надежного и качественного электроснабжения «КТЭЦ» и потребителей в г. Каменск-Шахтинский.


- «Строительство ПС 35 кВ «Порт Катон» с ВЛ 35 кВ (в габаритах 110 кВ) «А32-«Порт Катон» Выполнен первый этап строительства – построена и введена в эксплуатацию ВЛ 35 кВ (в габаритах 110 кВ), которая предназначена для электроснабжения потребителей создаваемой «Игровой зоны». Сооружение ПС 35 кВ перенесено на последующие годы.

Структура капитальных вложений ОАО «МРСК Юга» приведена в таблице:

млн. руб. (без НДС)

	2006	2007	2008 операционный	2008 календарный
Направления инвестиционной деятельности – итого:	1 395,40	3 264,50	4 651,80	5 341,50
Электросетевые объекты, в том числе	1 165,40	2 260,40	3 723,16	4 296,50
<i>ТПУР</i>	584,20	1 094,70	1 370,15	1 554,80
<i>Новое строительство и расширение действующих объектов</i>	506,80	1 023,60	2 220,18	2 553,30
<i>Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь)</i>	74,40	142,10	132,83	188,40
Средства учета и контроля электроэнергии, в т.ч.	24,70	125,30	101,37	133,20
<i>АИИС КУЭ оптового рынка в составе инвестиционной программы</i>	13,10	19,90	56,64	63,50
<i>Прочие средства учета и контроля электроэнергии</i>	5,40	26,00	32,00	56,80
ПИР строительства будущих лет	43,70	210,50	205,74	213,10
Прочие производственные и хозяйственные объекты	47,00	138,00	470,14	513,00
Оборудование, не входящее в сметы строек	93,80	141,80	92,13	118,80
Объекты непромышленной сферы	0,10	1,40	0,00	0,00
Капитальные вложения в нематериальные активы	0,00	0,00	0,00	0,00
Долгосрочные финансовые вложения	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	20,60	387,20	59,26	66,80
Справочно:				
Освоение капитальных вложений по технологическому присоединению потребителей	18,10	734,20	2 131,73	2 478,30

За последние три года (2006г., 2007г., 2008г.) наблюдается прирост капитальных вложений в целом по всем направлениям инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга». Выполнение 2008 года увеличилось в полтора раза по сравнению с 2007 годом, и в четыре раза в сопоставлении с 2006 годом.

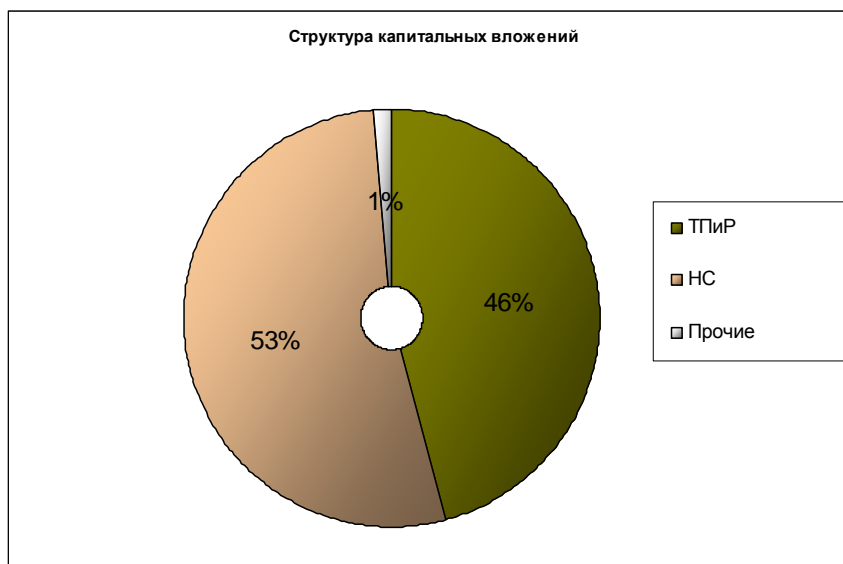

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Структура источников финансирования инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» за 2008 год:

млн. руб. (без НДС)

		ОАО «МРСК Юга» операционный	ОАО «МРСК Юга» календарный
Источники инвестиций, всего		4 651,80	5 341,48
Собственные источники финансирования	Амортизация отчетного года	1 348,08	1 672,52
	Неиспользованная амортизация прошлых лет		
	Неиспользованная прибыль прошлых лет		
	Прибыль отчетного года для использования в инвестиционной программе отчетного года, в том числе:	130,57	130,59
	<i>Плата за технологическое присоединение</i>	130,57	130,59
	Доп. эмиссия		
	Прочие собственные источники финансирования	53,56	63,61
Внешние источники финансирования	Бюджетные средства (федеральные, муниципальные)		
	Привлеченные средства (заемные процентные)	2 482,46	2 813,54
	Плата за технологическое присоединение – авансы	623,90	635,10
	Прочие источники внешнего финансирования, в т.ч. долевое участие в строительстве за счет прочих источников	13,23	26,13

Планируемые объемы финансирования инвестиционной программы Общества на 2009-2011 годы составляют **17 547,54** млн. рублей (без НДС), в том числе:

2009 год 5 531,45 млн. рублей (без НДС);
 2010 год 6 012,00 млн. рублей (без НДС);
 2011 год 6 004,10 млн. рублей (без НДС).

Реализация инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2009-2011 годы позволит создать возможность для технологического присоединения новых потребителей электроэнергии к электрической сети Общества.

Освоение капитальных вложений в период 2009-2011 гг. в сравнении с 2008 г. по ОАО «МРСК Юга» представлено в таблице:

млн.руб. (без НДС)

Наименование РСК	2008 операционный	2008 календарный	2009	2010	2011
Итого "МРСК Юга"	4 651,79	5 341,48	5 531,45	6 012,00	6 004,10
<i>ТПиР</i>	2 123,80	2 445,61	3 189,92	3 470,24	3 328,83
<i>Новое строительство</i>	2 468,74	2 829,07	2 197,91	2 541,73	2 675,3
<i>Прочее</i>	59,26	66,80	143,6		
Итого Исполнительный аппарат	251,46	251,46	262,14	0,00	2,15
<i>ТПиР</i>	251,46	251,46	122,14	0,00	2,15
<i>Новое строительство</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочее</i>	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
Итого филиал "Кубаньэнерго"	4,27	4,27	0,00	0,00	0,00
<i>ТПиР</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Новое строительство</i>	4,27	4,27	0,00	0,00	0,00
<i>Прочее</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого "Астраханьэнерго"	537,68	590,23	1 010,19	706,09	852,45
<i>ТПиР</i>	279,92	332,47	464,45	406,48	355,58
<i>Новое строительство</i>	254,50	254,50	545,74	299,61	496,87
<i>Прочее</i>	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00
Итого «Волгоградэнерго»	905,07	1 078,60	672,77	745,00	797,00
<i>ТПиР</i>	497,63	593,50	399,02	600,00	641,99
<i>Новое строительство</i>	407,45	485,10	270,15	145,00	155,00
<i>Прочее</i>	0,00	0,00	3,6		
Итого «Калмэнерго»	74,07	79,24	32,90	70,8	85,12
<i>ТПиР</i>	51,65	56,33	32,58	60,2	77,39
<i>Новое строительство</i>	2,92	3,42	0,32	10,6	7,73
<i>Прочее</i>	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00
Итого "Ростовэнерго"	2 879,25	3 337,69	3 553,43	4 490,1	4 267,42
<i>ТПиР</i>	1 043,14	1 211,85	2 171,72	2 403,59	2 251,72
<i>Новое строительство</i>	1 799,60	2 081,78	1 381,7	2 086,51	2 015,70
<i>Прочее</i>	36,52	44,06	0,00	0,00	0,00

Объём планируемых капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой ОАО «МРСК Юга» за 2009-2011 годы представлен на графике:

млн. руб. (без НДС)

